内容经营 · 实施规划

# 高乐捷内容经营闭环·实施规划与优先级

*Implementation Roadmap, Completed Work and Priority Rationale*

| | |
|---|---|
| 提交对象 | 高乐捷管理层与相关部门 |
| 文档版本 | v1.1（按现场任务计划清单重排，补已完成动作与两部门可用能力） |
| 编制 | 词元引擎 FDE |
| 编制日期 | 2026年10月19日 |
| 密级 | 内部资料，请勿外传 |

## 高乐捷

*GOLOVE JOY*

## 一、这份规划要解决什么

**目的**：把《内容经营闭环》方法论接到高乐捷的现场排期上，回答四件事——**已经做到哪一步了、两个部门今天能用它干什么、接下来按什么顺序做、做到什么程度算过**。

一句话目标：**10 月内让"一条素材 ↔ 一次投放 ↔ 一笔成交"双向可查，把最小闭环先跑通一次**，让内容部与运营部的分析有同一份输入，也让后面所有提效工具与 GEO 有可挂靠的地方。

不做什么同样要说清：本期不追求全自动投放，不追求全量历史素材补齐，不承诺任何提效比例与金额（数值口径待试点跑完双方商定）。

## 二、已经完成的动作（可逐条核对）

### 数据与系统底座

| 已完成的动作 | 时点 | 现在能用来做什么 |
| --- | --- | --- |
| 千川投放数据、聚水潭订单数据进系统 | 阶段一 | 按商品与投放计划维度自助查消耗与成交，不必再登后台拼表 |
| 素材库迁移至内容库 | 阶段一 | 素材集中存放、检索、取片，历史素材第一次有统一入口 |
| 数据门户上线＋钉钉权限 | 阶段一 | 各部门按权限看数，取数不再靠人代跑 |
| 千川开放平台能力盘点与接口清单（含硬约束） | 10/14 | 自动化与授权的可做范围已界定，少走弯路 |

### 规则与标准

| 已完成的动作 | 时点 | 现在能用来做什么 |
| --- | --- | --- |
| 六段素材编号规则拍板（款号 • 卖点 • 时间 • 作者 • 主题 • 版本） | 10/14 | **不必等系统**，今天起新出的素材即可按此命名入库 |
| 内容经营 SOP 业务执行版骨架 v0.9（素材部 • 平面设计 • 运营部） | 10/12 | 三部门签认的底稿已成形，歧义项已标出 |
| 待确认清单 • 四项共识落地（D1 – D4 与逐节点待确认项） | 10/12 | 管理层可逐项拍板的清单已成形 |
| 素材与数据关联四件套（方案说明 • 字段与规则 • 全链路案例 • 试点与验收） | 10/15 | 试点范围、责任矩阵、验收标准已定，可直接开跑 |

### 方法与工具

| 已完成的动作 | 时点 | 现在能用来做什么 |
| --- | --- | --- |
| 内容库↔渠道数据关联泳道图（现状 / 改造后，共用 S1 – S8 环节行） | 10/14 | 两部门对着同一张图确认断点在哪、各改哪一格 |
| 复盘两张台账（台账A 测试标记 / 台账B 结论验证） | 10/10 交付，运营使用中 | 周会记录与结论验证已有固定格式 |
| 内容复盘会五段式模板 | 已沉淀 | 60 分钟周会可直接照开 |
| 新品需求分析样板 v2（卖点→买点） | 10/10 | 新品立项与内容策略的输入格式 |

## 三、今天就能上手：两个部门分别能做什么

### 运营部（抖音•天猫投放）

- 在数据门户按商品与计划维度自助看数，把"哪个款在跑"这件事从后台搬运变成打开页面；
- 用台账A 标记本轮测试素材、台账B 登记结论与验证结果，复盘不再靠记忆；
- 现行"复制文件名去平台搜"的动作仍要人工做，但已画在现状图上，可直接指出最耗时的两处，作为 10/20 之后第一批被替代的环节；
- 新素材入库时按六段编号命名，从今天起即可执行，不必等系统改造。

### 内容部（编导•拍剪•平面设计）

- 用需求分析样板 v2 提报新品买点，作为脚本的正式输入；
- 素材统一入内容库，按商品维度找片，不再散在个人电脑；
- 周会按五段式模板走"逐条看片 • 高光帧定位"，把"哪一秒讲的哪个卖点有效"记进台账；
- 对照泳道图 S1 – S3 三格，确认自己这一段的交接格式（需求单、脚本、编号）。

**两部门共同**：SOP 骨架 v0.9 已按七要素写好，只等 D1 – D4 拍板即可签认；签认后它就是交接与验收的依据，不再靠群里喊话。

## 四、近期两个结点，与整条链的改造对照






说明：10/20 与 10/22 为现场规划已定的结点；后三段的先后顺序由依赖关系决定，见下一张图。

**10/20（前置功能•数据基座与后溯）**：交付三件事——按素材编号取到它的全部数据、内容库增加手动关联入口、内容自动发布。验收看四点：给定任一编号能查到消耗、曝光、点击、成交与投放计划；查不到的素材有明确原因提示，不静默返回空；人工补关联可由运营同事独立完成；数据与平台后台抽样核对一致。

**10/22（结点打通•前溯，内容与运营部分析的主要依据）**：一条素材能追回它对应的需求、卖点、作者与版本。验收看三点：同一商品不同版本的素材可并列比较，看得出哪一版更好；内容部与运营部用同一份数据开一次复盘会；会后能指名"下一轮改什么输入"。

**改造的实质不是把人换成机器**，而是把"文件名"换成"编号"、把"人记着"换成"系统挂着"。下面两张图共用同一套环节行 S1 – S8 逐行对齐，红色虚线为已确认断点（编号对应《流程梳理》B1 – B7）。

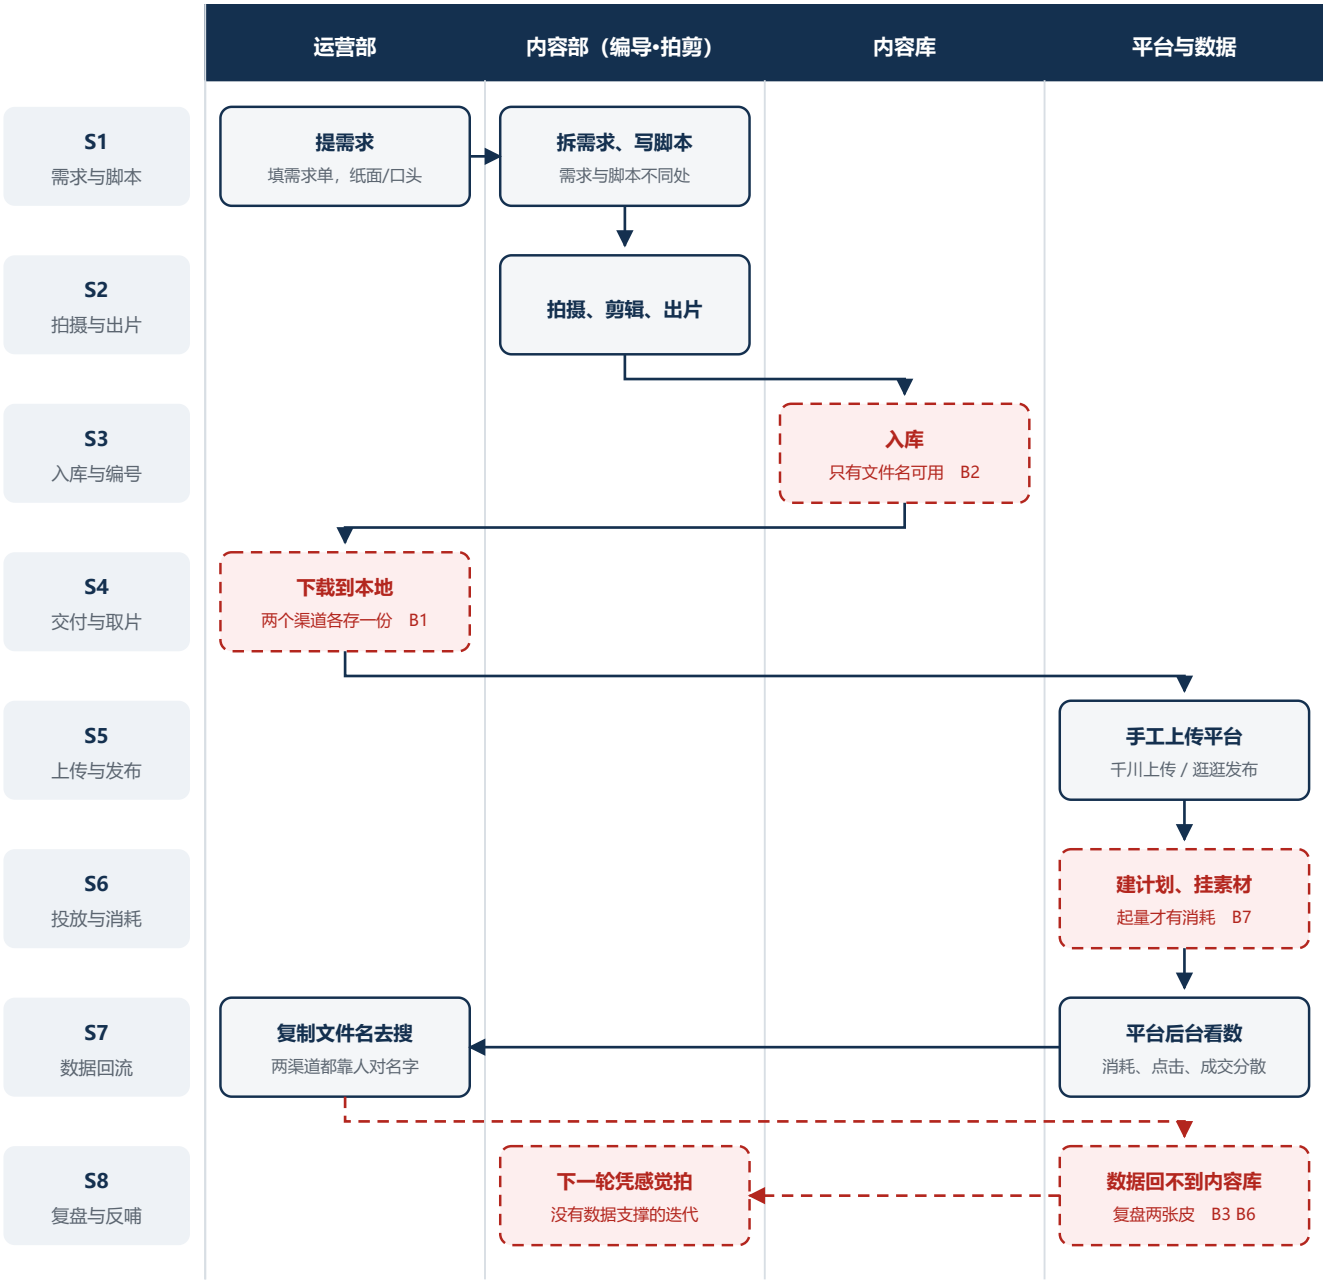
运营部
内容部（编导·拍剪）
内容库
平台与数据
S1
需求与脚本
S2
拍摄与出片
S3
入库与编号
S4
交付与取片
S5
上传与发布
S6
投放与消耗
S7
数据回流
S8
复盘与反哺
提需求
填需求单，纸面/口头
拆需求、写脚本
需求与脚本不同处
拍摄、剪辑、出片
入库
只有文件名可用 B2
下载到本地
两个渠道各存一份 B1
手工上传平台
千川上传 / 逛逛发布
建计划、挂素材
起量才有消耗 B7
平台后台看数
消耗、点击、成交分散
复制文件名去搜
两渠道都靠人对名字
数据回不到内容库
复盘两张皮 B3 B6
下一轮凭感觉拍
没有数据支撑的迭代

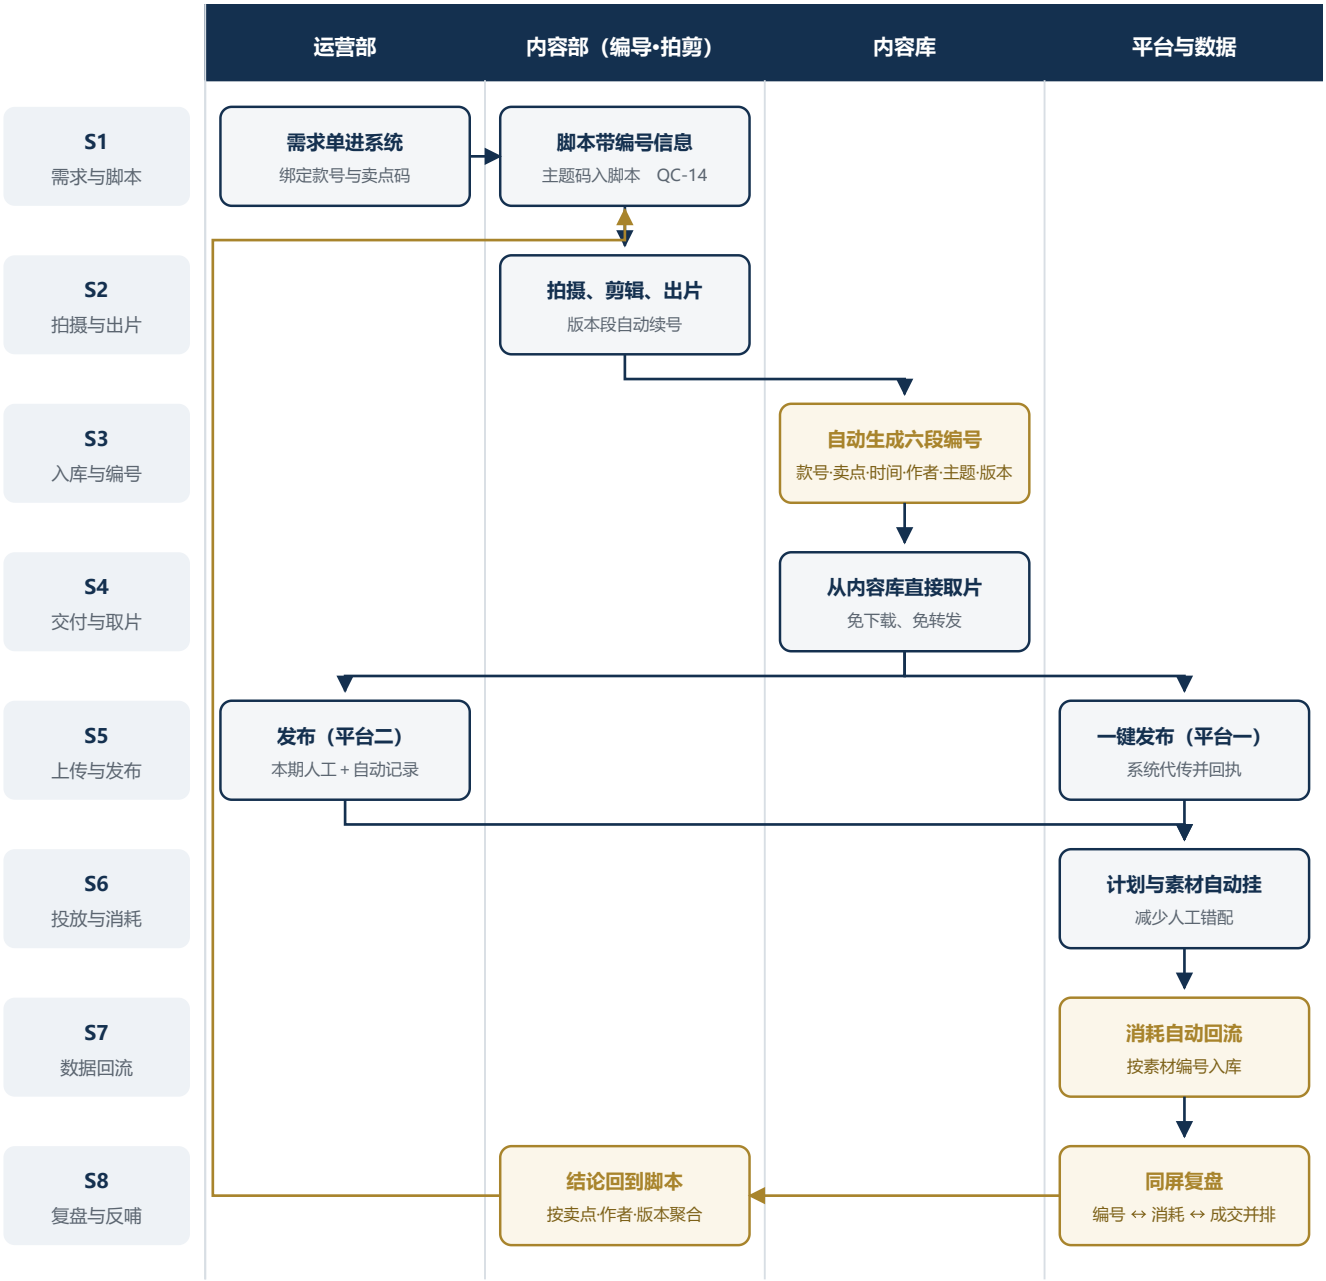


## 五、结点之后的实施清单（按现场规划原序）

### 第一部分

| 序 | 事项 | 做什么 | 目的 | 前置与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP 适配高乐捷 | 把 v0.9 骨架按三部门现网流程改定、签认、发布 | 让标准落到岗位上，不再靠个人经验 | 前置 D1 – D4；**待拍板** |
| 2 | 优先级：市场·人群·竞对 | 竞对分析、达人筛选与建联的输入维度与产出格式标准化 | 把 02 内容策略三段输入统一，产出可执行的计划 | 未启动 |

| 序 | 事项 | 做什么 | 目的 | 前置与状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SPU（单链接多商品） | 视频编号标准化解决"素材挂哪个商品"，发布时关联商品 | 让成交能落到具体素材与商品上 | 编码已定；**成交拆分口径待确认（QC-27）** |
| 4 | 工具迁移 | 现有工具统一入口、账号与权限 | 减少切换与重复登录，为工作台做准备 | 需先出工具清单；未启动 |
| 5 | 内容发布自动化、投流自动化 | 先做半自动防错配，再谈全自动 | 把人工出错率降下来，而不是先把人撤下来 | 前置平台授权；未启动 |
| 6 | 营销工具搭建 | 对外能力接口，例：一条素材三个版本的迭代效果对比、某素材的数据明细 | 让分析不再依赖人拉表，AI 可直接调用 | 前置 10/20 后溯数据；未启动 |
| 6 附 | 商品评论抓取（现场诉求） | 一线用户声音进系统，供产品经营闭环使用 | 把口碑变成可分析的输入 | **依赖平台授权范围（敏感物料），未到位前不写入承诺** |

## 第二部分

| 序 | 事项 | 做什么 | 目的 | 前置与状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品库、卖点库、编导集平台 | 建三张基础库，服务于视频素材编码 | 让编号里的款号段、卖点段有权威来源 | **未建，是前溯质量与看板的地基** |
| 2 | GEO | 与钛镁对接，先做品牌可见度基线与知识资产梳理 | 让品牌被 AI 提及、引用、推荐 | 见第七节；依赖内容资产与可归因链路 |
| 3 | 内容制作 | GoloVersion2.0 生图软件、视频工具 | 提质为主，顺带提效 | 未启动 |
| 4 | BI 看板 | BOSS 财务维度 / 部门维度 / 多平台 | 让老板与主管各看各的主指标 | 前置数据齐与口径统一 |
| 5 | 内容库功能增强 | 视频帧解析、视频解读（小天补全）、高光帧提取与混剪 | 把复盘会"人眼看片定位高光帧"变成系统能力 | 前置 10/22 前溯 |
| 6 | 内容库草稿箱 | 收集内容部未定稿素材 | 素材不落地在个人设备 | 未启动 |
| 7 | 提交内容库时说明卖点 | 上传人填写卖点说明 | 前溯能追到"为什么这么拍" | **待定** |


### 第三部分

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 流程标准化（L3 - L4）固化 | 把《链路梳理汇总表》的节点与实现步骤写成可执行、可调用的规程 |
| Skill、业务口径字典、对外能力接口 | 把方法与口径写成 AI 可读、可调用的形式，沉淀成公司资产 |
| 知识库搭建、部门工作台 | 各部门在同一入口完成日常作业与查询 |
| 提效工具、公司内部服务器、脚本收集与监控平台 | 承载底座与运维可见性 |

### 待确认点

图片在内容闭环中的作用与封面由谁做——现场判断为"自己做，无需美工部 / 电商视觉部配合"，涉及部门交接边界，**归入 D1 与 QC-26 一并拍板，本文不代答**。

## 六、先做后做的依据：看谁挡着谁

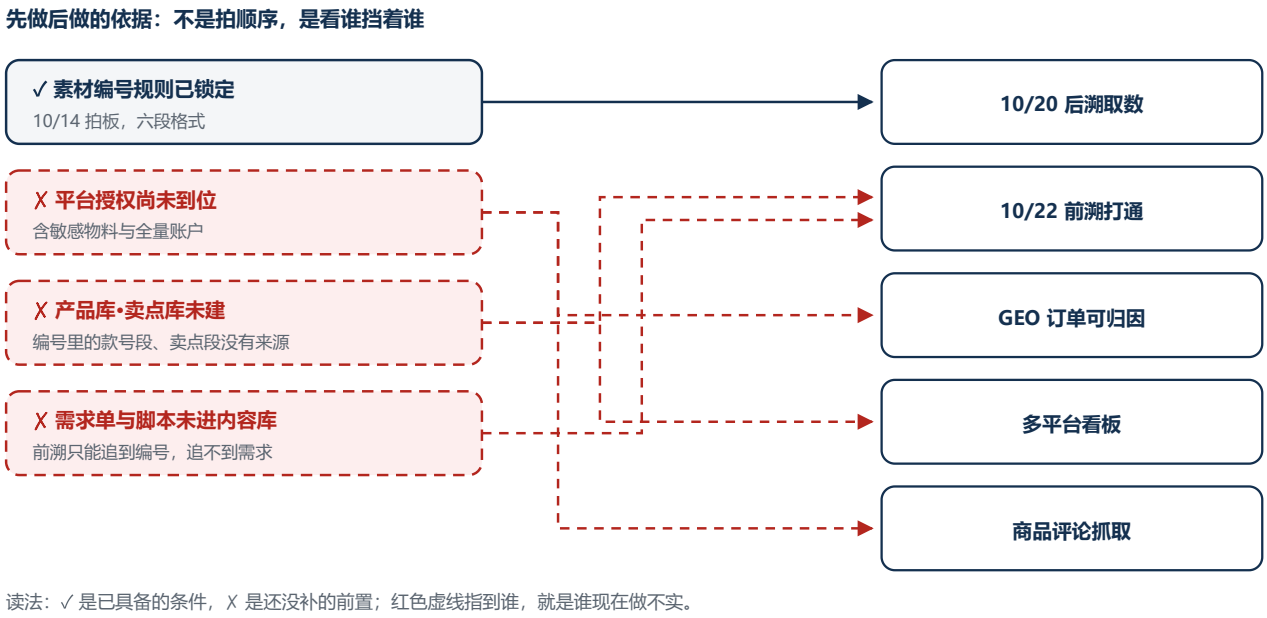


读法：✓ 是已具备的条件，X 是还没补的前置；红色虚线指到谁，就是谁现在做不实。

三句话说清顺序为什么是这样：**后溯先于前溯**，因为后溯只依赖已经进系统的数据，前溯还要依赖内容库写入侧把编号与需求补齐；**产品库与卖点库虽排在第二部分，但它挡的是编号质量**，所以它的实际启动时间要提前到 10/22 之前，否则前溯追到的卖点段是手填的、不可信；**平台授权是唯一"晚一天就少一天"的等待**，报表回溯窗口有限，历史数据补不回来，评论抓取与自动化也都卡在它后面。

## 七、GEO 专项：资料要点、与闭环的衔接、待核实

**服务商**：钛镁时代（上海）人工智能科技有限公司（钛镁AI），分众传媒集团战略投资，上海总部，北京·广州·深圳·江苏设分支；GEO 团体标准参编企业；两项网信算法备案；ISO27001 认证。（纪要与听写中记作"泰美"，即此公司。）

**它做什么**：八环业务飞轮——意图识别与问题预判、品牌合规知识图谱、品牌资产补全与校准、创作模型训练、全渠道智能分发、效果数据可见、AI 搜索表现监测、竞争防御；底层三大引擎分别回答"用户在问什么""AI 如何认知品牌""平台信源偏好怎么变"。

**交付与收费（厂商口径，未核实）**：核心交付标准为优化后各平台提及率 ≥75%，基础交付为全平台全年媒体发布 ≥600 篇；基础费用 5.5 万元一次性（业务场景分析 1.6 万＋模型训练与内容定制 1.8 万＋合规与管理 2.1 万），月度服务费 2.5 万元 / 月 / 平台；以 4 个主流 AI 平台、10 个意图为例，季度包 35.5 万、半年包 55.5 万、年度包 105.5 万；可优化 6 大 AI 平台。案例数字（奶粉、个护、家电、商用打印设备等提及率由 20%–40% 提至 75%–98%）均为厂商自述，**不作为我方对高乐捷的效果承诺**。

**对我们最关键的一条**：资料称豆包已打通抖音商城，**抖店结算账单可独立标记豆包渠道订单、GEO 订单可实现完整归因**；千问打通淘宝、元宝打通京东。若经平台侧实测成立，则"AI 只能解决对比、支付断档"的判断需要更新——**归因链路已经能从 AI 推荐一路走到店铺订单**，而这恰好需要我们这一侧的素材—商品—成交数据接得住。

**与内容经营闭环的衔接**：GEO 的输入是结构化品牌知识资产（卖点、参数、案例、口碑口径），正是 02 内容策略与 06 资产沉淀的产出物；GEO 的效果指标（提及率、首推位次、情感倾向）只有与我们的成交数据并排看，才知道 AI 的推荐有没有变成生意。**所以对外口径是：GEO 的投入产出，只有在闭环跑起来之后才可计量。**

**待核实（挂 QC-28）**：抖店账单是否真的独立标记豆包渠道订单、归因颗粒度到商品还是到素材；服务包与报价是否适配内衣品类；意图问题库由谁提供与维护；提及率验收由哪一方测量。

## 八、需要公司配合与拍板的事项

| 编号 | 事项 | 需要谁定 | 不定会怎样 |
|---|---|---|---|
| D1 | 定责任与交接边界（含图片与封面归属） | 管理层 | SOP 无法签认，交接仍靠群里喊 |
| D2 | 定制作投入与优先级 | 管理层 | 素材需求量算不出来，闭环空转 |
| D3 | 定有效标准与反馈方式 | 管理层＋两部门 | 复盘结论无法转成动作 |
| D4 | 定人和 AI 的工作范围 | 管理层 | 工具建设没有挂靠点，易被替代 |
| QC-07 | 需求单与脚本是否进内容库 | 内容部 | 前溯只能到编号，到不了需求 |

| 编号 | 事项 | 需要谁定 | 不定会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| QC-13 | 款号是否挂全量商品主数据 | 运营＋商品 | 编号里的款号段无权威来源 |
| QC-14 | 卖点、作者、主题三张码表由谁维护 | 内容部 | 编号填错无人发现 |
| QC-08 / QC-11 | 平台授权（敏感物料、全量账户） | 管理层 | 历史数据持续丢失，评论与自动化受阻 |
| QC-26 | 图片与封面在闭环中的作用、是否需视觉岗位配合 | 管理层 | 该环节边界不清，SOP 留白 |
| QC-27 | 单链接多商品的成交分摊口径 | 管理层＋运营 | 跨商品归因失真，看板数字无法解释 |
| QC-28 | GEO 归因能力与商务条款核实 | 管理层＋我方 | 无法判断 GEO 投入能否被计量 |

## 九、口径与来源声明

**来源**：第五节清单按现场任务计划原序整理（前置功能与 10/20、10/22 结点，第一、第二、第三部分）；第二、三节的已完成动作与部门可用能力，逐条对应项目库内已交付物与阶段记录；断点编号 B1－B7、待确认编号 QC-xx、四项共识 D1－D4 沿用既有编号，未新造流程。第七节 GEO 内容取自《钛镁GEO介绍》（2026-10-12 版，44 页），其中数字与效果表述均为厂商资料口径。

**忠实性**：本文不虚构目标值、阈值与责任人任命；未闭环事项以编号挂账，确认一项锁定一项；厂商自述的效果数字一律标注来源与"未核实"，不转为对甲方的承诺。

**术语**：文中"编号"指已锁定的六段素材编号；"平台一 / 平台二"分别指抖音侧与天猫侧投放环境；GEO 指生成式引擎优化。

**密级**：内部资料，请勿外传。涉及个人姓名、内部评价与未验证数字的内容不进入对外版本。
